

دائرة الإشراف وإدارة المشاريع إحدى دوائر مديرية الهندسة / قطاع الأشغال العامة

والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تقديم الخدمات الهندسية وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ المشاريع الإنشائية وإدارة عقودها ومتابعتها مالياً وفنياً لضمان جودتها وديمومتها، كما تقوم بإدارة عقود مشاريع الإشراف الخارجي ومتابعتها فنياً ومالياً بما يضمن تحقيق الجودة المطلوبة وبما يحقق استراتيجيات أمانة عمان، كما انها تقوم بمتابعة النزاعات والخلافات التي قد تحدث أثناء ادارة وتنفيذ العقد .

اهم انجازات الدائرة من المشاريع : تقوم دائرة الاشراف وادارة المشاريع بالإشراف على عدد من العطاءات استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات تحت سن (١٧) لعام ٢٠١٦ حيث تشمل على اعمال اعادة تأهيل ستاد الملك عبدالله مراحل ، بالإضافة الى اعمال انشاء ملاعب تدريبية عدد 7الثاني / القويسمه ضمن ٥ خاصة بالبطولة (ملعب الجبيهه /ملعب خريبة السوق/ ملعب نادي الجزيرة / ملعب اليرموك / ملعب حدائق الحسين) كما تشرف على تنفيذ عطاءات المبادرة الملكية والتي تشمل انشاء وتأهيل عدد من الحدائق ، بالإضافة الى الاشراف على تنفيذ المشاريع المختلفة وحسب الخطة التشغيلية لمديرية الهندسة .



٢٠١٦

دائرة الإشراف وإدارة المشاريع

مشروع إعادة تأهيل ستاد الملك عبدالله الثاني / القويسمة / المرحلة

الأولى

عطاء رقم : ٢٠١٥/١/٢٤

• وصف المشروع :-

يتضمن العمل المطلوب أعمال إعادة تأهيل لستاد الملك عبدالله الثاني من مكاتب و وحدات صحية و مدرجات و انشاء مبنى جديد مكون من اربعة طوابق يتم ربطه مع المبنى القائم بالاضافة الى مظلة معدنية فوق المنصة الرئيسية و أعمال الميكانيك و الكهرباء و أنظمة المراقبة و المولدات الاحتياطية و إنشاء قاعة مؤتمرات صحفية ، و كافة الأعمال اللازمة لإنجاز الأعمال على أكمل وجه حسب المواصفات و المخططات و تعليمات المهندس المصمم و المهندس المشرف .


• الهدف من المشروع :-

تأهيل استاد الملك عبدالله الثاني على المدى القريب بما يتناسب مع المواصفات و حسب شروط الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للمشاركة في البطولات العالمية بشكل عام و بملف كأس العالم للشباب بشكل خاص على المدى البعيد ، أن تكون هنالك مرافق رياضية داعمة للمنتخبات الوطنية و الأندية المحلية بالبطولة المحلية و القارية و العالمية حسب تصنيفات الإتحاد الدولي لكرة القدم A+ .

- أمر المباشرة : ٤/٧/٢٠١٥ .
 - مدة المشروع : ٢٤٠ يوم .
 - تاريخ انتهاء المشروع : ٢٩/٢/٢٠١٦ .
 - التمديدات العقدية : ٢٠ يوم .
 - تاريخ إنتهاء المشروع مع المدد المبررة : ٢٠/٣/٢٠١٦ .
 - نسبة الإنجاز التراكمية الفعلية حسب الأنشطة : ٩٩% تحت الاستلام
- المقاول المنفذ : شركة نمر اللوزي وشركاه للتعهدات العامة**

➤ آخر ما تم انجازه:

➤ جميع الأعمال منجزة وقيام المقاول بالعمل على انجاز ملاحظات ونواقص لجنة الاستلام الأولى.

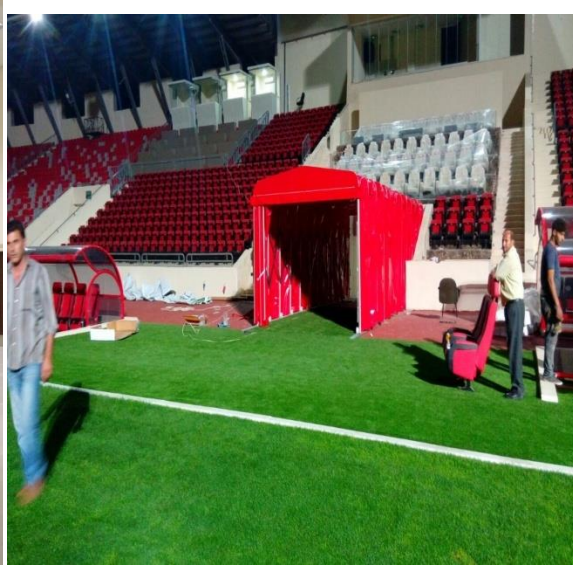





٢٠١٦

دائرة الإشراف وإدارة المشاريع

ملخص لمشروع تأهيل ستاد الملك عبدالله / المرحلة الثانية (ملعب

النجيل الطبيعي)

عطاء رقم : ٢٠١٥/١/٨٨

وصف المشروع:

- يتضمن المشروع مجموعة من الاعمال من اجل تأهيل ارضية ستاد الملك عبدالله الثاني / القويسمة ويشمل الاعمال ازالة جميع طبقات الملعب السابقة وانشاء طبقات جديدة ومن ثم طبقتان من رمل السيل بسماكة (١٠ سم) لكل طبقة بأحجام A1A تبدأ من طبقة متدرجة ومن ثم طبقة سيلكا بسماكة (١٥ سم) وطبقة زراعية بسماكة (١٥ سم) كما ويشمل العمل خلال هذه الطبقات تصريف امطار الملعب بمواسير مثقبة بقطر (٤ انش) ومواسير مغلقة بأقطار (٦+٨ انش) يتم ربطها على شبكة تصريف الأمطار كما يشمل العمل تأهيل المضمار بالإسفلت الملون وعمل القواعد الخرسانية بأماكن مقاعد اللاعبين ويشمل ايضاً توريد الماكينات الزراعية.

أمر المباشرة : ٢٠١٥/٧/٢١ .

مدة المشروع : ٣٩٠ يوم.

تاريخ انتهاء المشروع : ٢٠١٦/٨/١٣ .

نسبة الإنجاز التراكمية الفعلية: ٩٩% تحت الاستلام.

- المقاول المنفذ : الشركة الفنية للهندسة والمقاولات

➤ جميع الأعمال منجزة وقيام المقاول بالعمل على انجاز ملاحظات

ونواقص لجنة الاستلام الأولي.



لمشروع إعادة تأهيل ستاد الملك عبد الله الثاني / المرحلة الثالثة)

الشاشة الإلكترونية العملاقة)

عطاء رقم : ٢٠١٥/١/١٠٠

وصف العمل :

- يتضمن العمل المطلوب تصميم وتوريد وتركيب وفحص شاشة
- الالكترونية عملاقة بمساحة حوالي (٢٩٥م) شاملاً الأعمال المدنية
- والمعدنية بإرتفاع مناسب للجمهور بحيث تعرض الشاشة صور
- وفيدويوهات وأرقام وكتابة وحسب متطلبات الفيفا.
- أمر المباشرة : ٢٠١٥/٨/١٥
- قيمة العطاء : ٣٣٣٣٣٣ دينار.

دائرة الإشراف وإدارة المشاريع

• مدة المشروع : ١٨٠ يوم.

• تاريخ انتهاء المشروع : ٢٠١٦/٢/١٥.

• نسبة الانجاز الفعلي التراكمي : ١٠٠%

المقاول المنفذ : مؤسسة اليعقوب للمقاولات.



➤ آخر ما تم انجازه :

➤ جميع الاعمال منجزه . وقيام المقاول بالعمل على انجاز ملاحظات ونواقص لجنة الاستلام الأولي.





مشروع إعادة تأهيل ستاد الملك عبد الله الثاني / المرحلة الرابعة (اعمدة

الإنارة) الجزء الاول

عطاء رقم : ٢٠١٥/١/١٢١

وصف العمل :

. يتضمن العمل المطلوب تصميم وتوريد كشافات الملعب والاشراف على التركيب والفحص والتوجيه لوحدات الإنارة والتسليم النهائي حسب متطلبات الفيفا وتصميم الهيكل المعدني الحامل للكشافات .

- أمر المباشرة : ٢٠١٥/١١/٤
- قيمة العطاء : ١٨٤٥٠٠ دينار.
- مدة المشروع : ٢٥٠ يوم.
- تاريخ انتهاء المشروع : ٢٠١٦/٧/١١ .
- نسبة الانجاز الفعلي ١٠٠ %
- المقاول المنفذ : الشركة المتحدة لأنظمة الإنارة.

➤ جميع الأعمال منجزة وقيام المقاول بالعمل على انجاز ملاحظات

ونواقص لجنة الاستلام الأولي.



مشروع إعادة تأهيل ستاد الملك عبد الله الثاني / المرحلة الرابعة)

الاعمال الكهربائية / الجزء الثاني

عطاء رقم : ٢٠١٥/١/١٨٢

وصف العمل :

- يتضمن العمل المطلوب تصميم وتوريد كشافات الملعب والإشراف على التركيب والفحص والتوجيه لوحدات الإنارة والتسليم النهائي حسب متطلبات الفيفا وتصميم الهيكل المعدني الحامل للكشافات .

• امر المباشرة : ٢٠١٥/١٢/٢٨

• قيمة العطاء : ١٨٤٥٠٠ دينار.

دائرة الإشراف وإدارة المشاريع

• مدة المشروع : ٢٥٠ يوم.

• تاريخ انتهاء المشروع : ٢٠١٦/٧/١١.

• نسبة الانجاز الفعلي ١٠٠%


• المقاول المنفذ : شركة العدوان للمقاولات.



➤ آخر ما تم انجازه :

➤ جميع الأعمال منجزة وقيام المقاول بالعمل على انجاز ملاحظات

ونواقص لجنة الاستلام الأولي.

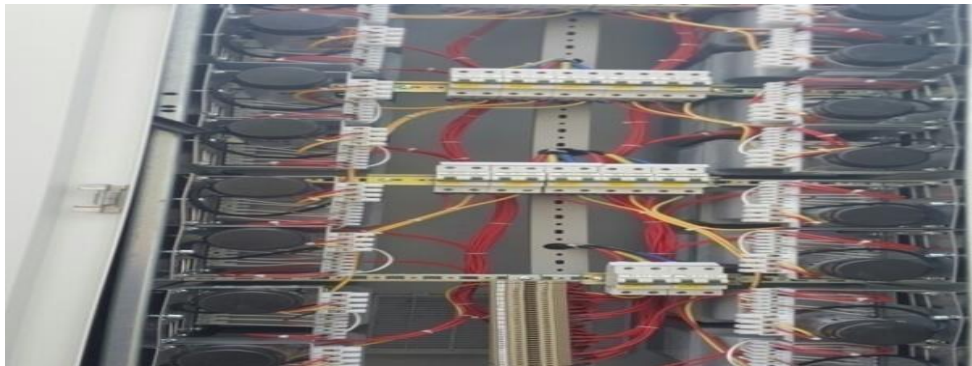



٢٠١٦

دائرة الإشراف وإدارة المشاريع

مشروع إعادة تأهيل استاد الملك عبد الله الثاني / المرحلة الخامسة (مقاعد المتفرجين

والدريزين)

عطاء رقم : ٢٠١٥/١/١٣٢

- - تاريخ امر المباشرة : ٢٠١٥/١١/٨ .
- - قيمة العطاء عند الاحالة : ٣٩٤٤٩٤،١٥٠ دينار اردني
- - مدة العطاء : ٢٢٥ يوم.
- - تاريخ انتهاء المشروع : ٢٠١٦/٦/١٦ .
- - نسبة الانجاز الفعلي : ١٠٠%
- المقاول المنفذ : مؤسسة الفريق.
- آخر ما تم انجازه:
- جميع الاعمال منجزه . وقيام المقاول بالعمل على انجاز
- ملاحظات ونواقص لجنة الاستلام الأولي.



إعادة تأهيل ستاد الملك عبدالله الثاني - القويسمة / المرحلة السادسة إنشاء الاعمال الخارجية والساحات

عطاء رقم : ٢٠١٥/١/١٦٥

وصف العمل:

- يتضمن العمل المطلوب الاعمال الخارجية والساحات وإنشاء المدخل الرئيسي الجديد لاستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة لاستقبال بطولة كأس العالم للسيدات تحت سن ١٧ سنة (الاردن ٢٠١٦) حيث يتضمن اعمال الجدران الاستنادية والاسوار المحيطة بالساحات الجديدة واعادة انشاء الارصفة المحيطة بالاستاد وصيانة الاسوار القائمة المحيطة وإنشاء الساحات الاسفلتية لتتسع الى (٦١٨ موقف سيارة) على الاقل واعمال الانارة لهذه الساحات والاعمال الكهربائية واعمال الري بالضافة الى انشاء مدخل رئيسي جديد للإستاد وحسب شروط ومواصفات العطاء.



٢٠١٦

دائرة الإشراف وإدارة المشاريع

تاريخ امر المباشرة : ٢٠١٥/١٢/٢٢ .

قيمة العطاء عند الاحالة = ١٣٣٩٧٣٠ دينار .

مدة العطاء : ١٥٠ يوم من تاريخ امر المباشرة.

تاريخ انتهاء المشروع تعاقديا: ٢٠١٦/٥/٢٠ .

نسبة الانجاز الفعلي = ١٠٠%

المقاول المنفذ : شركة بيم للمنشآت المعدنية.**آخر ما تم انجازه:**

جميع الأعمال منجزة وقيام المقاول بالعمل على انجاز ملاحظات ونواقص لجنة الاستلام الأولي.

اعادة تأهيل ستاد الملك عبدالله الثاني - القويسمة/ نظام الصوتيات**عطاء رقم : ٢٠١٥/١/١٩١****وصف العمل :**

- ١- تصميم وتقديم وتركيب وفحص وتشغيل نظام صوتيات متكامل (public address system) لكل مما يلي :-
 - أ- الاجهزة الخاصة بمستلزمات الصوت الملعب .
 - ب- الاجهزة الخاصة بمستلزمات الصوت لمدركات الجمهور .
 - ت- غرفة السيطرة وغرفة (server room) وأمن الملعب بكافة الأجهزة ومستلزماتها الداخلية والخارجية ويشمل العمل كافة الإكسسوارات والكوابل وجميع ما يلزم لتشغيل النظام حسب متطلبات الفيفا المرفقة .
 - ث- التسليم لمختصي الفيفا أو من ينوب عنهم حسب شروط الوثيقة .
 - أمر المباشرة : ٢٠١٦/٢/٣
 - القيمة الإجمالية : ١١٨,٥٠٠ دينار
 - انتهاء الأعمال المطلوبة قبل : ٢٠١٦/٣/٣٠
 - نسبة الانجاز الفعلي: ٩٩%
 - المقاول المنفذ : المؤسسة العالمية للتقنيات الحديثة .
- آخر ما تم انجازه:

➤ تم تركيب جميع السماعيات ومضخمات الصوت وال mixer والمعالجات ونظام ال catu كاملا وجهاز اللاسلكي.



انشاء ملاعب تدريبية في منطقة خريبة السوق عطاء رقم : ٢٠١٥/١/٨٧

- . **وصف المشروع :**
- . يقام هذا المشروع على قطعة ارض لأمانة عمان مساحتها ٢٣ دونم في منطقة خريبة السوق.
- . حيث يتكون من ملعب رئيسي زراعي ، وملعب خماسي من النجيل الصناعي ومبنى من ثلاث طوابق لخدمة المتدربين وإدارة المشروع ومباني خدمية أخرى(غرفة حراسة،غرفة مضخات،خزانات لمياه الري .

تاريخ امر المباشرة : ٢٠١٥/٩/١٢ .

قيمة العطاء عند الاحالة = ٢٠٠،١٨٤،٢٦١،٢ دينار .

مدة العطاء : ٢٤٠ يوم من تاريخ امر المباشرة.



دائرة الإشراف وإدارة المشاريع

تاريخ انتهاء المشروع : ٢٠١٦/٥/٩ .

نسبة الانجاز التراكمية : ٩٨ %

المقاول المنفذ : شركة الجود للمقاولات الانشائية

- آخر ما تم انجازه من اعمال:
- المشروع جاهز لتسليم الاعمال كاملة.

انشاء ملاعب تدريبية في منطقة الجبيهة

عطاء رقم : ٢٠١٥/١/١١٨

وصف المشروع:

- يتضمن العمل المطلوب أعمال إنشاء ملعب تدريبي دولي في منطقة نادي الجبيهة الرياضي من النجيل الصناعي، بالإضافة لأعمال سياج معدني وأسوار خارجية وبنية تحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار وإنارة الملعب ومدرجات محيطه به، ومواقف سيارات ومبنى إدارة وخدمات وغرف تبديل للاعبات وقاعات استراحة وأعمال ميكانيك وكهرباء وأنظمة مراقبة ومكافحة حريق وسلامة عامه وضمن متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

عناصر المشروع:

- ملعب بمساحة ٨ دونم
- مبنى خدمات وإدارة
- مبنى غرفة حارس
- مواقف باصات سياحية عدد ٢
- مواقف للزوار عدد ٩٠
- مواقف للمبنى عدد ١١
- أعمال مدرجات




دائرة الإشراف وإدارة المشاريع

- أعمال خزان ماء
- أعمال ساحات خارجية

تاريخ امر المباشرة : ٢٠١٥/٩/١٢ .
 قيمة العطاء عند الاحالة = ٨٩٢,٧٦٧,٠٠٠ دينار .
 مدة العطاء : ١٨٠ يوم من تاريخ امر المباشرة .
 تاريخ انتهاء المشروع : ٢٠١٦/٣/١٠ .
 نسبة الانجاز حتى تاريخه : ١٠٠% تحت الاستلام
المقاول المنفذ : مؤسسة كمال تيم للمقاولات

• آخر ما تم انجازه:

جميع الأعمال منجزة وقيام المقاول بالعمل على انجاز ملاحظات ونواقص لجنة الاستلام الأولي.

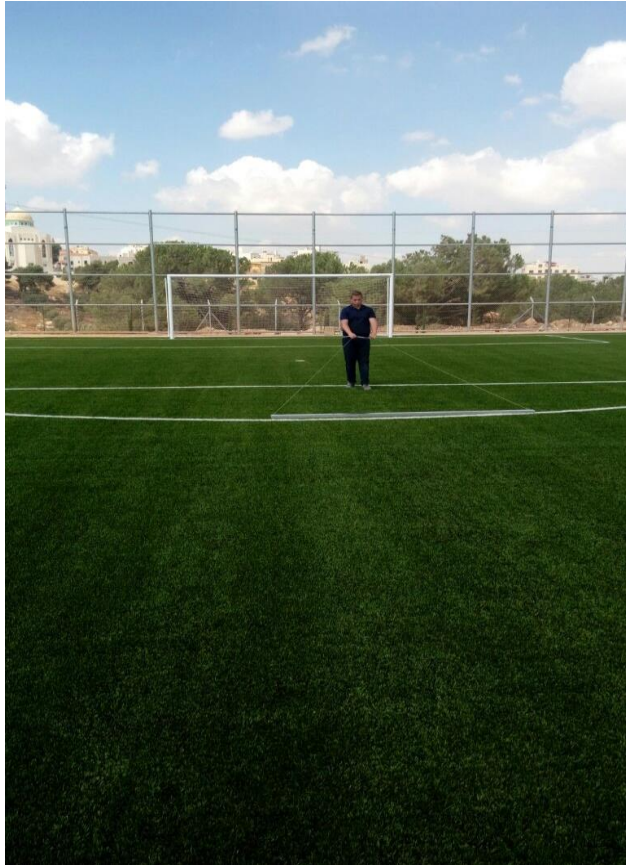



دائرة الإشراف وإدارة المشاريع
انشاء ملاعب تدريبية في منطقة نادي الجزيرة
عطاء رقم : ٢٠١٥/١/١٢٢

وصف العمل:

- يتضمن العمل المطلوب أعمال إنشاء ملعب تدريبي دولي في منطقة غمدان من النجيل الصناعي، بالإضافة لأعمال سياج معدني وأسوار خارجية وبنية تحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار وإنارة الملعب ومدرجات محيطه به، ومواقف سيارات ومبنى إدارة وخدمات وغرف تبديل للاعبات وقاعات استراحة وأعمال ميكانيك وكهرباء وأنظمة مراقبة ومكافحة حريق وسلامة عامهوضمن متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).
- -مساحة الأرض ١٥ دونم تقريبا
- - ملعب دولي تدريبي (٧٦ * ١٠٩ = ٨٢٨٤) متر مربع
- - مبنى خدمات بمساحة ٢٦٥ م^٢ ويتكون من طابق واحد يحتوي على:
- - استقبال
- - غرف للإدارة والمدربين
- - حمامات للرجال والسيدات / لغير اللاعبين
- - حمامات وشاورات للاعبين
- - غرفة اسعافات أوليه
- - مواقف سيارات تتسع لخمسون سيارة
- - خزان ماء أرضي عدد: ٢
- - قياس ٣*٤*٣ متر مكعب خلف المواقف
- - قياس ٣*٤*٦ متر مكعب لتجميع مياه الأمطار من الملعب
- - حفرة امتصاصيه عدد ٢
- - قياس ٢*٢*٢ متر مكعب تخدم غرفة الحارس
- - قياس ٣*٤*٦ متر مكعب تخدم المبنى
- - غرفة حارس مع خدماتها
- - كما تشمل الاعمال انشاء جدران محيطه بالملعب وسياج معدني فوقها واعمال أسوار محيطه بالموقع مع بوابة . بالإضافة لأعمال الكهرباء والميكانيك الخاصه بالملعب والمبنى.

تاريخ امر المباشرة : ٢٠١٥/٩/٢٨ .
 قيمة العطاء عند الاحالة = ١,٠٢١,٠٨٠,٠٦٠ دينار .
 مدة العطاء : ١٥٠ يوم من تاريخ امر المباشرة .
 تاريخ انتهاء المشروع تعاقديا : ٢٠١٦/٢/٢٥ .
 نسبة الانجاز الفعلي التراكمي : ٩٩%
المقاول المنفذ : اردال للهندسة والمقاولات

• آخر ما تم انجازه من أعمال :
 وقيام المقاول بالعمل على انجاز ملاحظات ونواقص لجنة . جميع الاعمال منجزه
 الاستلام الأولي





دائرة الإشراف وإدارة المشاريع ٢٠١٦

انشاء ملاعب تدريبية لنادي اليرموك

عطاء رقم : ٢٠١٥/١/١٥١

وصف المشروع :

- إنشاء ملعب رئيسي .
- مبنى إدارة وخدمات .
- مدرجات للملعب .
- مواقف سيارات .
- مبنى حراسة .
- Land escape

تاريخ امر المباشرة : ٢٠١٦/١/١٧ .

قيمة العطاء عند الاحالة = ١١٩,٩٤٥,٩٠٠ دينار .

مدة العطاء : ١٥٠ يوم من تاريخ امر المباشرة.

تاريخ انتهاء المشروع تعاقديا: ٢٠١٦/٦/١٥ .

نسبة الانجاز حتى تاريخه : ٩٩%

المقاول المنفذ : المنظومة الاردنية للمقاولات الانشائية



- جميع الأعمال منجزة وقيام المقاول بالعمل على انجاز ملاحظات ونواقص لجنة الاستلام الأولي.



اعادة تأهيل الملعب التدريبي / حدائق الحسين

عطاء رقم : ٢٠١٦/١/٢

نبذة ووصف المشروع :

- ازالة الترنكات القديم وطبقات الاسفلت والطبقات تحت الاسفلت وتقديم وتركيب نجيل صناعي وصيانة السياج حول الملعب وتغيير الشبك المجلفن وصيانة الانترلوك في الساحة امام مبنى الانشطة بالاضافة الى صيانة مبنى الانشطة .

تاريخ امر المباشرة : ٢٠١٦/٢/٢٩



٢٠١٦

دائرة الإشراف وإدارة المشاريع

قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : ٥٤٧٦٩٠ دينار

مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ١٥٠ يوماً

تاريخ انتهاء العطاء تعاقدياً : ٢٠١٦/٧/٢٩

نسبة الانجاز حتى تاريخه : ١٠٠%

المقاول المنفذ : مكتب المهندس عبدالرزاق كلبونه





دائرة الإشراف وإدارة المشاريع

آخر ما تم انجازه من أعمال :

جميع الأعمال منجزة وقيام المقاول بالعمل على انجاز ملاحظات ونواقص لجنة الاستلام الأولي.





دائرة الإشراف وإدارة المشاريع ٢٠١٦

انشاء ملاعب تدريبية في منطقة طارق

عطاء رقم : ٢٠١٦/١/٧٠

نبذة ووصف المشروع :

- . انشاء ملعب كرة قدم بابعاد دولية نجيل صناعي ومبنى ادارة وغرف غيار وخدمات للاعبين ومواقف سيارات وممرات وسياج واسوار وغرفة حارس وخزانات وحفر تجميعية .
- . تاريخ قرار الإحالة : ٢٠١٦/٦/٢٦
- . الشركة المنفذة : شركة الطليعة للمقاولات
- . موقع المشروع / المنطقة :
- . منطقة طارق
- . قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : ١٢٦٦٢٨٢,٨٦٢ دينار
- . تاريخ امر المباشرة : ٢٠١٦/٧/٢٣
- . مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ١٢٠ يوم
- . تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا : ٢٠١٦/١١/٢٠
- . التاريخ المتوقع لانهاء اعمال العطاء : ٢٠١٦/١١/٢٠
- . نسبة الانجاز حتى تاريخه : ٦٢%

آخر ما تم انجازه :

- . اعمال حفريات ٩٠% تم تنفيذها قواعد واعمدة وغرفة الحارس وانهاء الجدران الخارجية الخرسانية وخزان المياه





دائرة الإشراف وإدارة المشاريع ٢٠١٦

إعادة تأهيل ملعب جامعة العلوم التطبيقية

عطاء رقم : ٢٠١٦/١/١١١

تاريخ امر المباشرة : ٢٠١٦/٧/١١

قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : ١٨٠٤٦٠ دينار

مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ٦٠ يوماً

تاريخ انتهاء العطاء تعاقدياً : ٢٠١٦/٩/١١

نسبة الانجاز حتى تاريخه : ١٠٠%

المقاول المنفذ : شركة موندو للانشاءات

آخر ما تم انجازه : جميع الأعمال منجزة وقيام المقاول بالعمل على انجاز ملاحظات ونواقص لجنة الاستلام الأولى.





٢٠١٦

دائرة الإشراف وإدارة المشاريع

توزيع تقديم اعمال تأهيل مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية/تجهيز منصة

كبار الزوار

عطاء رقم (٢٠١٦/٢/١٤٤١)

تاريخ امر المباشرة : ٢٠١٦/٨/١١

قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : ٨٣٠٥٠ دينار

مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ٥٥ يوماً

تاريخ انتهاء العطاء تعاقدياً : ٢٠١٦/١٠/٦

نسبة الانجاز حتى تاريخه : ١٠٠%

المقاول المنفذ : شركة القدس للتجهيزات الفنية.

آخر ما تم انجازه:

جميع الأعمال منجزة وقيام المقاول بالعمل على انجاز ملاحظات ونواقص لجنة الاستلام الأولى

عطاء توريد تجهيزات رياضية وطبية للملاعب

التدريبية / بطولة كأس العالم للناشئات

رقم العطاء (٢٠١٦/١/١١٥)

تاريخ قرار الاحالة : ٢٠١٦/٧/٤

الشركة المنفذة : مؤسسة الفريق للألبسة الرياضية

موقع المشروع / المنطقة : ملاعب بطولة كأس العالم للناشئات



٢٠١٦

دائرة الإشراف وإدارة المشاريع

- . **نبذة ووصف المشروع :** توريد تجهيزات رياضية وطبية للملاعب التدريبية / بطولة كأس العالم للناشئات تحت سن ١٧ سنة .
- . **اهداف المشروع :** تجهيز الملاعب بالاجهزة والمعدات الطبية والرياضية خدمة للاعبين والحكام والجهاز الفني.
- . **قيمة العطاء حسب قرار الاحالة :** (٦٧٨٩٧) سبعة وستون ألفاً وثمانمائة وسبعة وتسعون ديناراً .
- . **تاريخ امر المباشرة :** ٢٠١٦/٧/١٤ .
- . **مدة العطاء حسب قرار الاحالة :** ٤٥ يوم
- . **تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا :** ٢٠١٦/٨/٢٩
- . **نسبة الانجاز الفعلي التراكمي :** ٩٥%
- . **آخر ما تم انجازه:**
- . **جميع الأعمال منجزة وقيام المقاول بالعمل على انجاز ملاحظات ونواقص لجنة الاستلام الأولي**

انشاء قاعة متعددة الاغراض وحديقة الدوبوية / منطقة القويسمة

عطاء رقم : ٢٠١٥/١/١٨٨

- . **نبذة ووصف المشروع :**
- . انشاء قاعة متعددة الاغراض ضمن الحديقة
- . انشاء حديقة الدوبوية وملعب ضمن الحديقة
- . انشاء مبنى وحدات صحية وغرفة حارس
- . **تاريخ امر المباشرة :** ٢٠١٦/٢/٦
- . **قيمة العطاء حسب قرار الاحالة :** ٤٨١١٨٦ دينار
- . **مدة العطاء حسب قرار الاحالة :** ١٣٥ يوما
- . **تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا :** ٢٠١٦/٦/٢٠



٢٠١٦

دائرة الإشراف وإدارة المشاريع

نسبة الانجاز حتى تاريخه : ٩٠%

المقاول المنفذ : اردال للهندسة والمقاولات

انشاء حديقة الزهور / راس العين / المبادرات الملكيةعطاء رقم : ٢٠١٥/١/١٨٤**نبذة ووصف المشروع :**

- انشاء مبنى للإدارة على طابقين
- انشاء غرفة حارس وملعبين خماسيين
- انشاء ساحات للأطفال ومسار للدراجات
- انشاء ممرات المشاة والأسوار والأرصحة الخارجية.
- تاريخ امر المباشرة : ٢٠١٦/٣/٣
- قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : ٦٨٤٩٦٠ دينار
- مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ١٣٥ يوما
- نسبة الإنجاز التراكمية لتاريخه (٩٦%)
- آخر ما تم انجازه:
- تم انجاز جميع الاعمال باستثناء ألعاب الأطفال.

المقاول المنفذ : خالد البستنجي وشركاه للمقاولات



الاطفال/ تجهيز ملاعب الملكية/ التأسيس المبادرات

الثانية/الثالثة) /المرحلة(الاولى

رقم العطاء : ٢٠١٦/١/١٥

- نبذة ووصف المشروع :
- اعادة تأهيل الحدائق بعمل مدات خرسانية وانشاء كندرين وانشاء ملاعب رمل

- أهداف المشروع :
- ضمن المبادرة الملكية لتأهيل الحدائق وتجهيزها لاستقبال ارضيات مطاطية والعباب
- تاريخ قرار الاحالة : ٢٠١٦/٢/١٥
- الشركة المنفذة : مؤسسة كمال تيم للمقاولات
- موقع المشروع / المنطقة : مواقع متفرقة
- قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : (٢٣٤٩٤٠) دينار.
- تاريخ أمر المباشرة : ٢٠١٦/٣/١٥.
- نسبة الانجاز التراكمي الفعلي : ٩٦,٣٠%
- آخر ما تم انجازه (المرحلة الأولى): تم انجاز أعمال الاحواض الرملية والخرسانية لجميع الحدائق وتزويدها بالالعباب.
- آخر ما تم انجازه (المرحلة الثانية): تم انجاز أعمال الاحواض الرملية والخرسانية لجميع الحدائق وتزويدها بالالعباب.
- آخر ما تم انجازه (المرحلة الثالثة): تم انجاز أعمال الاحواض الرملية والخرسانية لجميع الحدائق وتزويدها بالالعباب.
- نسب الانجاز لملاعب الاطفال (ملاعب رملية ومطاطية) في الحدائق التالية :

اسم الحديقة	نسبة الانجاز
حديقة ام عمر الفيصل	100%
حديقة موسى السكاك	100%
حديقة الوحدة	95.00%
حديقة سارية العلم	95.00%
حديقة الاستقلال	٩5%
حديقة الاميرة سلمى	٩٥%
حديقة المحامين	١٠٠%
حديقة الجبيهة المرورية	100%
حديقة الراية الهاشمية	95.00%
حديقة الفتح	95.00%
حديقة الملكة نور	9٥.00%
حديقة الامير هاشم	90%
حديقة الامير حسين بن عبد الله	9٩%
حديقة عمر الفيصل المرورية	85%
حديقة قاطمة الزهراء	90%
حديقة ميدان السباق	90.00%

٩٠%	حديقة البشائر
95%	حديقة مرج دابق
90%	حديقة الوفاء والعهد
٩٥%	حديقة الأميرة بديعة
١٠٠%	حديقة راس العين
اسم الحديقة	نسبة الانجاز
حديقة الياسمين	%٩٥
حديقة صلاح الدين	%٩٠
حديقة الأميرة ايمان	%١٠٠
حديقة الرحمة	%٩٥
حديقة الألفية	%٩٨
حديقة مرج الحمام	%٨٠
حديقة دير الغبار	%٩٧
حديقة مسجد حفيظة	%٩٧
حديقة القويسمه المرورية	%١٠٠
حديقة مؤته	%٩٥
حديقة الأسرة	تم اخراجها من المبادرات







دائرة الإشراف وإدارة المشاريع ٢٠١٦

انشاء قبور في مقبرة سحاب الاسلامية

عطاء رقم ٢٠١٥/١/١٢٥

نبذة ووصف المشروع :

- . حفر وبناء وصب جدران للقبور وصب بلاطات فوق القبور
- وإعادة الطم فوق القبور

اهداف المشروع :

- . تأمين قبور لمنطقة العاصمة
- . الشركة المنفذة : المؤسسة الثنائية للمقاولات

موقع المشروع / المنطقة :

- . مقبرة سحاب الإسلامية
- . قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : ٥٣٠٠٠٠٠٠ دينار.
- . تاريخ أمر المباشرة : ٢٠١٥/١٠/٣١.
- . مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ١٧٥ يوماً
- . تاريخ انتهاء العطاء تعاقدياً : ٢٠١٦/٤/٢٢
- . نسبة الانجاز الفعلية : ٩٩%

آخر ما تم انجازه :

- . تم انشاء قبور ٤٠٠٠ قبر كبيرة، و ٤٠٠٠ صغيرة وبلاطات احتياط ١٠٠٠٠٠٠





دائرة الإشراف وإدارة المشاريع ٢٠١٦

انشاء قبور في مقبرة سحاب الاسلامية

عطاء رقم ٢٠١٦/١/٢٦

بذة ووصف المشروع :

- . اعمال بناء قبور كبيرة عدد ٤٠٠٠ قبر وقبور صغيرة ٤٠٠ قبر ،
وضب ١٠٠٠٠ بلاطة قبور احتياط

اهداف المشروع :

- . تأمين قبور اسلامية لمنطقة العاصمة
- . تاريخ قرار الاحالة : ٢٠١٦/٤/٥
- . الشركة المنفذة : المؤسسة الثنائية للمقاولات

موقع المشروع / المنطقة :

- . مقبرة سحاب الإسلامية
- . قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : ٥٩٥٩٨٠ دينار.
- . تاريخ أمر المباشرة : ٢٠١٦/٤/٢٣ .
- . مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ١٧٥ يوماً
- . تاريخ انتهاء العطاء تعاقدياً : ٢٠١٦/١٠/١٤
- . نسبة الانجاز الفعلي التراكمي : ٦٠%

توريد وتركيب وصيانة نجيل صناعي

عطاء رقم ٢٠١٦/١/٣٥

نبذة ووصف المشروع :

- . تركيب وصيانة نجيل صناعي لملاعب التابعة للأمانة.
- . تركيب نجيل صناعي وصيانة عامة للحدائق الفاتحة
- . اهداف المشروع :
- . تهيئة الملاعب المراد تركيب نجيل صناعي لها والمراد صيانتها لتلائم الغرض المطلوب
- . تاريخ قرار الاحالة : ٢٠١٦/٣/١٠

دائرة الإشراف وإدارة المشاريع
• الشركة المنفذة: شركة موندو للإنشاءات

موقع المشروع / المنطقة :

- في مواقع متفرقة ضمن حدود امانة عمان الكبرى
- قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : (١٤٨٩٩٨) دينار.
- تاريخ أمر المباشرة : ٢٠١٦/٤/١٧.
- مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ١٨٠ يوم.
- تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا : ٢٠١٦/١٠/١٤
- نسبة الانجاز الفعلي التراكمي: ٨٠%

آخر ما تم انجازه من أعمال:

- تم تركيب النجيل في حديقة الامير حسين والعمل جار على تركيبه في منطقة بسمان وباقي المناطق.





دائرة الإشراف وإدارة المشاريع ٢٠١٦

توريد وتركيب وصيانة نجيل صناعي

عطاء رقم ٢٠١٦/١/٥٨

نبذة ووصف المشروع :

- . تركيب وصيانة نجيل صناعي لملاعب التابعة للأمانة.
- . تركيب نجيل صناعي وصيانة عامة للحدائق الفاتحة

اهداف المشروع :

- . تهيئة الملاعب المراد تركيب نجيل صناعي لها والمراد صيانتها لتلائم الغرض المطلوب
- . تاريخ قرار الاحالة : ٢٠١٦/٥/٢٨
- . الشركة المنفذة : المتخصصة للتجارة والاستثمار
- . موقع المشروع / المنطقة :
- . في مواقع متفرقة ضمن حدود امانة عمان الكبرى
- . قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : (١٧٥٠٤٦,٥٠٠) دينار.
- . تاريخ أمر المباشرة : ٢٠١٦/٧/٩
- . مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ١٨٠ يوم.
- . تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا : ٢٠١٦/١٠/٢٨
- . نسبة الانجاز الفعلي التراكمي: ٢٧%

آخر ما تم انجازه من أعمال: تنظيف الملعب من النجيل القديم وتجهيز الارضيات لاستقبال النجيل الجديد.



إعادة تأهيل شارع المدينة المنورة وشارع صرح

الشهيد ومواقع متفرقة

عطاء رقم ٢٠١٤/١/١٦٢

تاريخ قرار الاحالة : ٢٠١٤/١٢/١٠

الشركة المنفذة : المنظومة الاردنية للمقاولات الانشائية

موقع المشروع / المنطقة : شارع المدينة المنورة ، شارع الحرية

نبذة ووصف المشروع :

- . اعمال جزر وسطية وطرفية ضمن مسارات محددة مساحياً.
 - . الجزر مكونة من كندرين وبلاط بحصة او كندرين وبلاط انترلوك.
 - . اعمال هدم وازالة للاسفلت والجزر القائمة الواقعة ضمن مسار الجزر التصميمية الجديدة.
 - . تنفيذ اعمال الجزر ضمن شارع الحرية وشارع المدينة المنورة بعد اعمال الرفع المساحي ودراسة الواقع المروري لكل من الشارعين.
- اهداف المشروع :** انسيابية المرور ضمن الشوارع المحددة للعطاء اعلاه وتخفيف الازمة المرورية على هذه الشوارع .



٢٠١٦

دائرة الإشراف وإدارة المشاريع

- قيمة العطاء حسب قرار الاحالة: (٦٢٩٧٠٠٠ دينار)
- تاريخ امر المباشرة: ٢٠١٥/١/٢٢
- مدة العطاء حسب قرار الاحالة: (١٢٠) يوماً
- تاريخ انتهاء العطاء تعاقدياً: ٢٠١٥/٥/٢١ حيث تم الاتفاق مع المقاول على تنفيذ مواقع بديلة
- نسبة الانجاز التراكمي الفعلي: ٩٠%

آخر ما تم انجازه:

تم انجاز اعمال العطاء في مرحلة التسليم.





٢٠١٦

دائرة الإشراف وإدارة المشاريع

عطاء اعادة تأهيل مبنى العبدلي /الطابق الأرضي وأعمال متفرقة

عطاء رقم ٢٠١٥/١/١٦٨

- رقم العطاء: ٢٠١٥/١/١٦٨ .
- تاريخ قرار الاحالة: ٢٠١٥/١٢/٢٦
- الشركة المنفذة: مؤسسة جمال النجار للهندسة والمقاولات
- قيمة العطاء حسب قرار الاحالة: (264,580.240) دينار.
- تاريخ أمر المباشرة: ٢٠١٦/١/١٧
- مدة العطاء حسب قرار الاحالة: ١٢٠ يوما
- نسبة الانجاز الفعلي التراكمي: ٩٨%
- آخر ما تم انجازه من أعمال:
- تم تشكيل لجنة الاستلام للكشف على الاعمال .

انشاء مظلات السوق المركزي

عطاء رقم ٢٠١٦/١/١٨٠

نبذة ووصف المشروع :

- صيانة المزاريب
- فك وإزالة اعدادات وتركيب مدادات جديدة
- صيانة الهيكل المعدني
- فك وإزالة الصاج وتركيب صاج جديد

اهداف المشروع :

- عمل صيانة للمظلات المشار اليهم في العطاء .
- تاريخ قرار الاحالة :
- الشركة المنفذة: شركة يوسف الذنبيات
- موقع المشروع / المنطقة :
- السوق المركزي
- قيمة العطاء حسب قرار الاحالة: (١٧٧,٥٧٥) دينار.
- تاريخ أمر المباشرة: ٢٠١٦/١/٢٣ .
- مدة العطاء حسب قرار الاحالة: ١٥٠ يوماً

أمانة
عمّان
الكبرى

٢٠١٦

دائرة الإشراف وإدارة المشاريع

• تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا : ٢٠١٦/٦/٢١

• نسبة الاتجاز الفعلي التراكمي: ٥٠%

آخر ما تم انجازه من أعمال: المشروع عبارة عن مظلتين كل مظلة فيها ٦٤ محل تم انجاز ٦٤ محل بنسبة ٩٠% والعمل الان ابتداء في المظلة الثانية منذ يومين.



تقديم أعمال إعادة تاهيل حاليبري القرية الثقافية

عطاء رقم ١١٦٨/٢/٢٠١٦

- تاريخ قرار الاحالة : ٢٠١٦/٤/١٣
- الشركة المنفذة : شركة عاطف الخشمان وشريكه.
- موقع المشروع / المنطقة :
- منطقة صويلح/حي حدائق الحسين.
- قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : ٣٦١٨٥٠٠٠٠
- تاريخ امر المباشرة : ٢٠١٦/٥/٤
- مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ٤٥ يوم
- مراحل الإنجاز حتى تاريخه:
- تم الانتهاء من جميع اعمال المشروع ما عدا بعض الملاحظات البسيطة.
- نسبة الانجاز الفعلي التراكمي: ١٠٠% تم الاستلام



قاعة متعددة الأغراض /منطقة شفا بدران عطاء رقم ٢٠١٦/١/٣٨

نبذة ووصف المشروع:

يتضمن العطاء انشاء قاعة متعددة الاغراض وتتكون من اعمال مدنية ومعمارية وميكانيكية وكهربائية وكذلك يتكون المشروع جدران استنادية واعمال تنسيق الموقع ومواقف سيارات وبمساحة للأبنية 405 م^٢.

اهداف المشروع :

العمل على خدمة المجتمع المحلي بكافة شرائحه الاجتماعية من مشاركة الامانة لهم بالجوانب التعليمية والاجتماعية وخلافه من خلال انشاء هذه القاعة.

- . تاريخ قرار الاحالة : ٢٠١٦/٤/٥
- . الشركة المنفذة : شركة حربي الحجاج للمقاولات الانشائية
- . موقع المشروع / المنطقة : منطقة شفا بدران
- . قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : ٣٢٤٤٠٢,٩٢٠ دينار
- . تاريخ امر المباشرة : ٢٠١٦/٥/٥
- . مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ١٥٠ يوم.
- . تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا : ١٠٢٠١٦/١٢
- . نسبة الانجاز الفعلي التراكمي: ٧٢%

آخر ما تم انجازه من أعمال: تم انجاز جميع الاعمال الرئيسية في المشروع.



تقديم وتركيب كرفان لقسم البيئة لمنطقة خريبة السوق وجاوا

عطاء رقم ٢٠١٥/٢/١٢٨٤

نبذة ووصف المشروع :

. تقديم وتركيب كرفان من قاعدة حديدية والسقف والجدران من الساندويش بانيل معزول بالفوم.

اهداف المشروع :

دائرة الإشراف وإدارة المشاريع

- تامين مكتب لقسم البيئة للمنطقة.
 - تاريخ قرار الاحالة : ٢٠١٥/١٠/١٠
 - الشركة المنفذة : شركة ترشيحا للمقاولات
 - موقع المشروع / المنطقة :
- قسم البيئة منطقة خريبة السوق وجاوا
- قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : (١٣٧٩٠,٠٠) دينار.
 - تاريخ أمر المباشرة : ٢٠١٥/١١/١٤.
 - مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ٢٠ يوماً
 - نسبة الانجاز الفعلي التراكمي : ٩٠% تحت الاستلام



انشاء مظلة دائرة المركبات

عطاء رقم ٢٠١٦/١/١٠

نبذة ووصف المشروع :

- . انشاء مظلة من تيوبات حديد IPE وجسور حديدية مركب عليها
الواح من الصاج ومزودة بإنارة كاملة.

اهداف المشروع :

- . تأمين مظلات للمركبات والسيارات المراد صيانتها في دائرة
المركبات.
- . تاريخ قرار الاحالة : ٢٠١٦/٤/٢٠
- . الشركة المنفذة : شركة المجموعه الفنية للهندسه والصيانه.
- . موقع المشروع / المنطقة :
- . دائرة الآليات - شارع اليرموك.
- . قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : ٨٧٦١٥ دينار.
- . تاريخ أمر المباشرة : ٢٠١٦/٥/٢١
- . مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ٦٠ يوما
- . نسبة الانجاز الفعلية التراكمية : ٧٠%





دائرة الإشراف وإدارة المشاريع
فك وإزالة هنجر حديقة اليرموك/حي أم تينة
عطاء رقم ٢٠١٥/٢/١٧٣٥

نبذة ووصف المشروع :

- فك الهنجر وازالته وازالة جميع الأعمال الانشائية تمهيدا لتسليمها كما كانت (ارض طبيعية) .
- اهداف المشروع :
- تجهيز الأرض حسب متطلبات الأمانة
- تاريخ قرار الاحالة : ٢٠١٦/٢/١١
- الشركة المنفذة : شركة فولاذ لأنظمة المباني
- موقع المشروع / المنطقة :
- منطقة اليرموك / حي ام تينة
- قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : ١٥,٩٠٠ دينار
- تاريخ امر المباشرة : ٢٠١٦/٣/٥
- مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ٣٠ يوم
- التمديدات الزمنية (ان وجدت) : -
- تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا : ٢٠١٦/٤/٣
- نسبة الانجاز الفعلية التراكمية : ٩٥%

تقديم اعمال صيانة لمنزل إمام مسجد النورين

عطاء رقم (٢٠١٦/٢/١٣٥٧)

- تاريخ قرار الاحالة : ٢٠١٦/٧/١٠
- الشركة المنفذة : مكتب زلطة للتعهدات
- موقع المشروع / المنطقة : رأس العين

نبذة ووصف المشروع :

- تنفيذ أعمال صيانة عامة من أعمال مدنية وميكانيكية وكهربائية
- اهداف المشروع :


٢٠١٦

دائرة الإشراف وإدارة المشاريع

- خدمة للمسجد وتحسين الظروف المعيشية للأمام وعائلته
- قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : (١١٧٨١) دينار.
- تاريخ أمر المباشرة : ٢٠١٦/٧/٣٠
- مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ٦٠ يوم.
- تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا : ٢٠١٦/١٠/١
- التاريخ المتوقع لانتهاء اعمال العطاء : ٢٠١٦/١٠/١
- نسبة الانجاز الفعلي التراكمي: ١٠٠%

أخر ما تم انجازه:

- تم انجاز اعمال المشروع

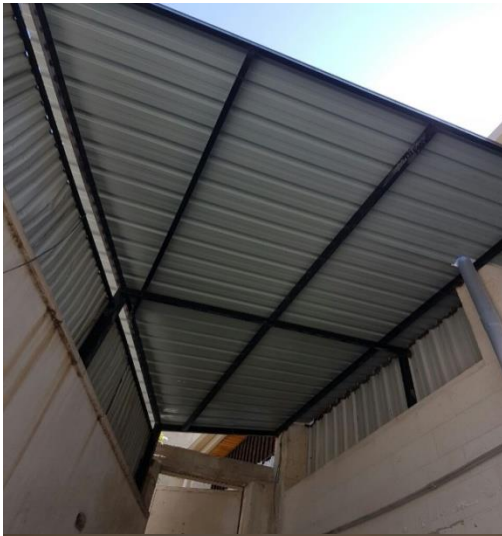

انشاء كشك الشرطة/ العبدليعطاء رقم ٢٠١٦/٢/١١٩٣**نبذة ووصف المشروع :**

- . انشاء كشك للشرطة في منطقة العبدلي بما يتضمنه كافة الاعمال الميكانيك والكهرباء اللازمة حسب المواصفات والمخططات .

اهداف المشروع :

- . انشاء كشك لرجال الشرطة لمتابعة اعمال السير
- . تاريخ قرار الاحالة : ٢٠١٦/٥/٢٦
- . الشركة المنفذة : شركة عاطف الخشمان وشريكه
- . موقع المشروع / المنطقة :
- . العبدلي- شارع الملكة نور فوق الجسر المؤدي الى العبدلي-مقابل شركة امنية
- . قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : ٢٩٩٩٩ دينار
- . تاريخ أمر المباشرة : ٢٠١٦/٧/٢ .
- . مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ٩٠ يوماً
- . تاريخ انتهاء العطاء تعاقديا : ٢٠١٦/٩/٢٩
- . التاريخ المتوقع لانهاء اعمال العطاء : ٢٠١٦/٩/٢٩
- . نسبة الانجاز الفعلي التراكمي: ٧٠%





٢٠١٦

دائرة الإشراف وإدارة المشاريع

اسوار مكب الغباوى

عطاء رقم (٢٠١٦/١/٩١)

- . تاريخ قرار الاحالة : ٢٠١٦/٦/٢٢
- . الشركة المنفذة : شركة باب الشرق للمقاولات.
- . قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : ٦٣٧٣٥٠ دينار
- . تاريخ أمر المباشرة : ٢٠١٦/٨/١٠
- . مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ١٢٠ يوماً
- . تاريخ انتهاء العطاء تعاقدياً : ٢٠١٧/٣/١٠
- . التاريخ المتوقع لانتهاء اعمال العطاء :
- . نسبة الانجاز الفعلي التراكمي: ٣٣%



تقديم أعمال تمديدات كوابل مكب الغباوي /الخلية الرابعة

عطاء رقم (٢٠١٦/٢/١٣٥٥)

- . تاريخ قرار الاحالة : ٢٠١٦/٧/٢٦
- . الشركة المنفذة : شركة الوفاء لتصنيع أجهزة الانارة واللوحات الكهربائية.
- . قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : ٥٨٠٠٠ دينار
- . تاريخ أمر المباشرة : ٢٠١٦/٨/١٥

دائرة الإشراف وإدارة المشاريع ٢٠١٦

- . مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ٤٥ يوماً
- . تاريخ انتهاء العطاء تعاقدياً : ٢٠١٦/١٠/١
- . التاريخ المتوقع لانتهاء اعمال العطاء :
- . نسبة الانجاز الفعلي التراكمي: ١٠٠%

توريد وتركيب شبكات الكمبيوتر والهواتف الأرضية/ العبدلى

عطاء رقم (٢٠١٥/١/١٧٠)

- . تاريخ قرار الاحالة : ٢٠١٦/٤/١٢
- . الشركة المنفذة : التقديمية التكنولوجية
- . قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : ١٢٣٧١٣,٣٥٢ دينار
- . تاريخ أمر المباشرة : ٢٠١٦/٥/٤
- . مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ٦٠ يوماً
- . تاريخ انتهاء العطاء تعاقدياً : ٢٠١٦/٧/١٠
- . التاريخ المتوقع لانتهاء اعمال العطاء :
- . نسبة الانجاز الفعلي التراكمي: ٩٩%



إعادة تأهيل مسلخ أمانة عمان الكبرى

عطاء رقم (٢٠١٦/١/١٢٤)

- تاريخ قرار الاحالة : ٢٠١٦/٨/٦
- الشركة المنفذة : مؤسسة جمال النجار للهندسة والمقاولات.
- قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : ٢٩٥٣٥٥ دينار
- تاريخ أمر المباشرة : ٢٠١٦/٩/٣
- مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ١٥٠ يوماً
- تاريخ انتهاء العطاء تعاقدياً : ٢٠١٧/٢/١٠
- التاريخ المتوقع لانتهاء اعمال العطاء :
- نسبة الانجاز الفعلي التراكمي : ٦٠%



صيانة أنفاق وجسور

عطاء رقم (٢٠١٦/١/٣٧)

- تاريخ قرار الاحالة : ٢٠١٦/٤/١٢
- الشركة المنفذة : شركة أيمن عمرو وشريكه.
- قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : ١٠٨٥٠٠ دينار
- تاريخ أمر المباشرة : ٢٠١٦/٤/٢٥
- مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ٢٤٠ يوماً
- تاريخ انتهاء العطاء تعاقدياً : ٢٠١٦/١٢/٣٠
- التاريخ المتوقع لانتهاء اعمال العطاء :
- نسبة الانجاز الفعلي التراكمي: ٣٨%
- تم الانتهاء من صيانة نفق مجمع جبر ونفق الشعب والعمل جاري على صيانة نفق ابو هره.



**تقديم وتركيب وصيانة للحواجز الحديدية الواقية في مواقع
متفرقة عطاء رقم (٢٠١٦/١/١٧)**

- تاريخ قرار الاحالة : ٢٠١٦/٢/٢٧
- الشركة المنفذة : شركة الأمان للخدمات الفنية.
- قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : ٧٣٤٣٣ دينار



٢٠١٦

دائرة الإشراف وإدارة المشاريع

- . تاريخ أمر المباشرة : ٢٠١٦/٣/٢٠
- . مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ٢٤٠ يوماً
- . تاريخ انتهاء العطاء تعاقدياً : ٢٠١٦/١١/٣٠
- . التاريخ المتوقع لانتهاء اعمال العطاء :
- . نسبة الانجاز الفعلي التراكمي: ١٠٠%

آخر ما تم انجازه:

. تم الاستلام

انشاء أسوار مستودع غير الصالح

عطاء رقم (٢٠١٦/١/١٢٩)

- . تاريخ قرار الاحالة : ٢٠١٦/٨/٢٩
- . الشركة المنفذة : مصطفى محمود للمقاولات الانشائية
- . قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : ١٨٥٧٠٦ دينار
- . تاريخ أمر المباشرة : ٢٠١٦/٩/٢٢
- . مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ٩٠ يوماً
- . تاريخ انتهاء العطاء تعاقدياً : ٢٠١٦/١٢/٣٠
- . التاريخ المتوقع لانتهاء اعمال العطاء :
- . نسبة الانجاز الفعلي التراكمي: ١٠%
- . آخر ما تم انجازه:
- . تم البدء بأعمال انشاء الاسوار.



عطاء اعادة تأهيل دوار النزّه
عطاء رقم (٢٠١٦/١/١٢٠)

تاريخ قرار الاحالة : ٢٠١٦/٨/٦ .
الشركة المنفذة : قمة عمان للمقاولات .



٢٠١٦

دائرة الإشراف وإدارة المشاريع

- . قيمة العطاء حسب قرار الاحالة : ١١٧٤٩٤ دينار
- . تاريخ أمر المباشرة : ٢٠١٦/٩/٣
- . مدة العطاء حسب قرار الاحالة : ٦٠ يوماً
- . تاريخ انتهاء العطاء تعاقدياً : ٢٠١٦/١١/٣
- . التاريخ المتوقع لانتهاء اعمال العطاء :
- . نسبة الانجاز الفعلي التراكمي: ٢٣%

